

富民县教育体育局 2021 年 永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金 绩效评价报告

委托单位名称：富民县财政局（章）

评价机构名称：云南扭之阳会计师事务所（普通合伙）（章）



项目评价起止时间：2022年10月26日至2022年11月30日

评价报告出具时间：2022年12月5日

目 录

摘 要.....	i
一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
1. 项目背景.....	1
2. 主要内容及实施情况.....	3
3. 资金投入和使用情况.....	6
（二）项目绩效目标.....	8
（三）项目组织管理情况.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	10
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	10
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	10
（三）绩效评价工作过程.....	14
三、绩效评价结论.....	15
四、绩效评价指标分析.....	17
（一）项目决策情况分析.....	17
（二）项目过程情况分析.....	21
（三）项目产出情况分析.....	24
（四）项目效益情况分析.....	27
五、存在的问题及原因分析.....	31
六、建议.....	32
七、其他需要说明的问题.....	33
附件.....	33

摘要

一、项目概况

富民县为做好全县义务教育“全面改薄”和“能力提升”工作，改善教育教学和基本办学条件，消除学校大班额，加强寄宿制学校建设，拟新建一所学校——永定小学（黎阳分校），根据 2020 年 11 月《富民县发展和改革局关于同意增加富民县永定小学（黎阳分校）建设内容和追加投资规模的批复》（富发改投资审批〔2020〕84 号），学校占地面积 33.5 亩，建筑面积 14693 平方米（包括综合楼、宿舍楼、食堂等），计划办学规模 1500 人，概算投资 5946.75 万元，项目资金来源于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金及县级财政资金。学校于 2020 年 12 月 1 日开工建设，2021 年 8 月 30 日开学，入住学生为昆一中富民学校七年级（初一）830 余名学生，入住学生人数为计划办学规模的 53.3%。

为满足正常开班办学条件，学校开学后，须配备常规教育教学类、实验室教学仪器类、办公类教学设施设备。2021 年 7 月 20 日，富民县教育体育局向富民县人民政府提出《关于请求安排永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金的请示》（富教局〔2021〕50 号），拟采购设施设备所需金额 313.2 万元，其中：申请县级资金 200 万元，其余 113.2 万元由义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金予以弥补。该项目经县十六届人民政府 2021 年第 12 次常务会研究，同意追加安排永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金 200 万元，2021 年 7 月 23 日取得富民县人民政府办公室的批复文件。

永定小学（黎阳分校）设施设备采购项目分为两个批次采购，2021 年 8 月经公开招标，富民县教体局采购第一批设备设施，中标金额 311.5326 万元；2021 年 9 月，因讲台及电脑桌不足，富民县教体局开展了二次采购，通过政府采购线上平台（云电子卖场），采购讲台 4 张、电脑桌 52 张，采购金额 4.168 万元。

二、评价结论

经过对 2021 年永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金进行绩效评价，分析了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等指标，该项目综合得分 80.86 分，评价等级为良。

项目绩效评价指标体系一级指标得分统计表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	15 分	20 分	35 分	30 分	100 分
得分率	76.67%	65.75%	96.29%	75.03%	80.86%
得分	11.50	13.15	33.70	22.51	80.86

三、存在的问题

（一）前期预算阶段调研不深入，导致部分音乐、美术设备利用率不够高

从设备移交学校后的利用率来看，课桌、黑板、办公设备等利用率较高，音乐、美术设备器材利用率低，部分音乐教学设备如钢琴、电贝司尚未使用，且无相应的音乐教师，造成设备闲置；其次，因入住学生为初中一年级，还未开设化学课，化学实验室几乎处于闲置状态。

（二）资产移交昆一中富民学校后，未落实好责任管理

经现场查看设备利用情况，设备保管责任落实不到位，个别实

验台设备损坏、多媒体黑板利用率低，部分设备损坏不能及时修理，截至报告日，富民县教育体育局已于 2022 年 11 月 18 日下发《关于对 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金采购学校教学设施设备项目物资进行登记上账的通知》（富教通〔2022〕106 号），要求永定小学（黎阳分校）设施设备及时入账，学校设施设备正在入账统计及清查中。

四、建议

（一）美术、音乐课程设备、实验室设备的配备建议

为优化学校设施设备配置，使学校设施、设备采购更加符合学校实际，建议考虑如下因素：音乐课、美术课的开设，应体现地方特色和民族特色，如民族音乐、民族乐器、民族舞蹈绘画、民族工艺品制作等，以乡土艺术、热爱家乡、传承非物质文化遗产为主题，既节约了资金投入，又能体现民族团结进步特色。

其次，教学类、实验室类设施采购，按开课的计划进度进行，如化学课为初中三年级课程，根据学生升入初三的时间采购该类设备，以避免设备长期闲置。

（二）资产移交后管理的相关建议

目前，学校已逐步进入了正常教学阶段，建筑、设施、设备已完成移交，为做好移交后的管理，让设施设备持续发挥作用，相关建议如下：

1. 资产正式移交后，应执行质保期（一般为 1 年）的规定，在质保期内发生质量问题，由设备供应方履行维护维修责任。

2. 学校制定教学类、办公类、住宿类、实验室类、音体美各类

设施、器材的管理办法，确定管护责任主体，设备发生损坏的，及时进行维修，将设施设备管理好、运营好。

3. 行政主管部门定期对移交的设施设备使用情况、管理情况进行监督与考核，让设备持续发挥效益。

4. 根据国家、省、市关于义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的相关要求，科学配备学校教学设施，开展学生教师满意度和需求调研，定期进行维护、维修、更新换代，保障教学的正常开展。

富民县教育体育局 2021 年 永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作要求，依据《富民县财政局关于开展 2022 年重点绩效评价工作的通知》，云南柘之阳会计师事务所（普通合伙）接受富民县财政局委托，于 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 30 日对“2021 年永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）指出，为解决义务教育发展不平衡不充分的矛盾，加快教育资源均等化步伐，围绕义务教育学校办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，由省级统筹相关资金和项目，合理确定工作目标和任务，加大对欠发达地区倾斜力度，持续改善农村基本办学条件，进一步降低义务教育阶段 56 人以上大班额比例、满足学生寄宿需求、提升教育信息化应用水平、有效保障体育美育劳动教育条件、加强校园文化建设

设，从而不断提高义务教育教学水平和质量。

富民县为做好全县义务教育“全面改薄”和“能力提升”工作，改善教育教学和基本办学条件，消除学校大班额，加强寄宿制学校建设，拟新建一所学校——永定小学（黎阳分校），根据 2020 年 11 月《富民县发展和改革局关于同意增加富民县永定小学（黎阳分校）建设内容和追加投资规模的批复》（富发改投资审批〔2020〕84 号），学校占地面积 33.5 亩，建筑面积 14693 平方米（包括综合楼、宿舍楼、食堂等），计划办学规模 1500 人，概算投资 5,946.75 万元，项目资金来源于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金及县级财政资金。学校于 2020 年 12 月 1 日开工建设，为解决富民县城周边适龄学生就学需求，校建成后，将用于昆一中富民学校七年级（初一）过渡性办学，于 2021 年 8 月 30 日开学，入住学生 830 余名，入住学生人数为计划办学规模的 53.30%。

为满足正常开班办学条件，学校开学后，须配备常规教育教学类、实验室教学仪器类、办公类教学设施设备。2021 年 7 月 20 日，富民县教育体育局向富民县人民政府提出《关于请求安排永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金的请示》（富教局〔2021〕50 号），拟采购设施设备所需金额 313.20 万元，其中：申请县级资金 200.00 万元，其余 113.20 万元由义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金予以弥补。该项目经县十六届人民政府 2021 年第 12 次常务会研究，同意追加安排永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金 200.00 万元，2021 年 7 月 23 日取得富民县人民政府办公室的批复文件。

永定小学（黎阳分校）设施设备采购项目分为两个批次采购，2021 年 8 月经公开招标，富民县教体局采购第一批设备设施，中标金额 311.5326 万元；2021 年 9 月，因讲台及电脑桌不足，富民县教体局开展了二次采购，通过政府采购线上平台（云电子卖场），采购讲台 4 张、电脑桌 52 张，采购金额 4.168 万元。

2. 主要内容及实施情况

2021 年 7 月 23 日，永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金的请示取得富民县人民政府办公室批复。

2021 年 7 月 26 日，富民县教体局对该项目采购计划进行了备案，计划采购金额 313.20 万元。

2021 年 7 月 26 日，富民县教体局委托云南卓宙工程咨询有限公司代理招标采购，签订了委托招标代理协议。

2021 年 7 月 27 日，富民县教体局在公共资源交易平台进行了项目招标公示。

2021 年 8 月 17 日，项目召开了评标会议，项目投标单位共计 5 家，经评标委员会评标，推荐云南易士捷科技有限公司为第一中标候选人，中标价为 311.5326 万元，中标结果于 8 月 18 日进行了公示。

2021 年 8 月 19 日，富民县教体局向中标单位发出中标通知书，于 8 月 26 日签订了《采购合同》，合同确定了部分项目换货事项：采购第六部分 7--15 项（价值 3.67 万元），因学校已完成安装，为避免重复投资，替换为同等价值的 21 个讲台（价值 3.675 万元），替换商品按 3.67 万元结算，即合同总金额不变。

2021 年 9 月 30 日起，设备设施陆续交付、接收。

2021 年 10 月 13 日，采购方、供货方、学校三方对设备设施进行了联合验收，验收结论为合格，三方共同签署了《验收报告》。

2021 年 10 月 13 日，富民县教体局将上述设备设施移交给昆一中富民学校（黎阳学校），双方签署了《移交书》。

2021 年 10 月 20 日，因第一批教学设备设施采购后，学校尚缺少讲桌和电脑桌，通过采购计划审批后，在云电子卖场询价采购，共采购讲桌 4 张、电脑桌 52 张，共计 4.168 万元。

2021 年 10 月 20 日，第二批设备进行了验收并支付了采购款（部门领导批复时间为 10 月 25 日，发票日期为 10 月 15 日）。

第一批教学设备设施采购统计表（合同金额 311.5326 万元）


序号	类别	明细项	数量 (项)	金额（元）	交付日期	备注
1	物理实验室	物理实验室仪器（酒精喷灯等）	94	25,545.60	2021/9/30	
		专用仪器（阿基米德原理实验器等）	121	33,437.60	2021/9/30	
		模型（轮轴模型等）	11	1,276.00	2021/9/30	
		挂图（物质的属性等）	14	174	2021/9/30	
		多媒体教学软件（机械运动和力）	14	206	2021/9/30	
		图书、手册（初中物理实验仪器手册）	2	168	2021/9/30	
		玻璃仪器（量筒等）	20	2,973.40	2021/9/30	
		药品（铁粉等）	10	895	2021/9/30	
		其他实验材料和工具（电工材料）	12	3,903.00	2021/9/30	
		小制作材料（机翼模型等）	7	2,222.00	2021/9/30	
		科技活动材料（组合面镜等）	8	3,088.00	2021/9/30	
		工具（测电笔等）	30	4,020.00	2021/9/30	
		安全防护用品（护目镜等）	3	159	2021/9/30	
		实验室设施（学生实验台、仪器柜等）	10	77,300.00	2021/9/30	
		小计	356	155,367.60		
2	化学实验室	实验室仪器（酒精喷灯等）	32	9,534.65	2021/9/30	
		测量仪器（托盘天平等）	10	4,586.20	2021/9/30	
		专用仪器（水电解演示器）	11	9,780.75	2021/9/30	
		模型（炼铁高炉模型）	7	4,947.30	2021/9/30	

序号	类别	明细项	数量 (项)	金额 (元)	交付日期	备注
		标本（合成有机高分子材料标本等）	4	271.4	2021/9/30	
		挂图、软件及资料（身边的化学物质）	8	667	2021/9/30	
		玻璃仪器（量筒等）	107	14,700.91	2021/9/30	
		药品（铝片等）	82	4,412.85	2021/9/30	
		其它实验材料和工具（钢丝钳等）	19	5,268.15	2021/9/30	
		实验室设施（学生实验台等）	16	92,414.00	2021/9/30	
		小计	296	146,583.21		
3	生物实验室	通用仪器（生物显微镜等）	27	30,715.75	2021/10/1	
		测量仪器（测微尺等）	11	3,999.51	2021/10/1	
		专用仪器（解剖器等）	11	3,664.88	2021/10/1	
		模型（植物细胞模型等）	38	7,768.53	2021/10/1	
		标本（鱼解剖浸制标本等）	35	2,617.73	2021/10/1	
		玻片（植物根尖纵切等）	71	1,097.92	2021/10/1	
		挂图、软件及资料（生物体的结构层次等）	18	999.03	2021/10/1	
		玻璃仪器（量筒等）	27	3,842.86	2021/10/1	
		材料和配套用品（试管夹）	13	2,306.43	2021/10/1	
		药品（碘化钠等）	25	1,599.79	2021/10/1	
		其它实验材料和工具（载玻片等）	11	2,575.89	2021/10/1	
		工具（仪器柜等）	39	88,161.16	2021/10/1	
		小计	326	149,349.48		
4	音乐教室设备、音乐器材	合唱排练台、电钢琴、电贝司等	23	138,004.00	2021/10/1	
5	美术教室设备及美术器材	小型版画机、拉胚机等	29	61,212.00	2021/10/1	
6	微机室电脑室设备	学生机（电脑一体机）、投影机、21张讲台等	7	616,140.00	2021/10/1	包含换货的21张讲台
7	学生课桌椅	单人单座 1000 套	1000	300,000.00	2021/10/1	
8	学生宿舍铁床	铁床（双层床）50 套	50	30,000.00	2021/10/1	
9	智慧黑板	LED 显示屏智慧黑板 25 套	25	945,000.00	2021/10/1	
10	办公电脑、办公桌椅	办公电脑 80 套	80	344,000.00	2021/10/1	
		办公桌椅 80 套	80	56,000.00	2021/10/1	
		小计	160	400,000.00		
11	文件柜、打印机	文件柜 40 个	40	20,720.00	2021/10/1	
		打印机 50 台	50	86,000.00	2021/10/1	
		小计	90	106,720.00		
12	复印机、速印机	复印机	1	17,000.00	2021/10/1	
		速印机	1	25,000.00	2021/10/1	
		小计	2	42,000.00		

序号	类别	明细项	数量 (项)	金额（元）	交付日期	备注
13	投影仪	爱普生投影仪 1 台	1	6,000.00	2021/10/1	
14	篮球架、 足球场球 门	篮球架 2 套	2	17,000.00	2021/10/1	
		足球场球门 1 套	1	1,950.00	2021/10/1	
		小计	3	18,950.00		
合计			2368	3,115,326.29		

第二批教学设备设施采购统计表

序号	类别	明细项	数量（项）	单价（元/张）	金额（元）	交付日期	备注
1	讲桌、电脑桌	讲桌	4	1450	5,800.00	2021/9/30	
		电脑桌	52	690	35,880.00	2021/9/30	
合计			56		41,680.00		

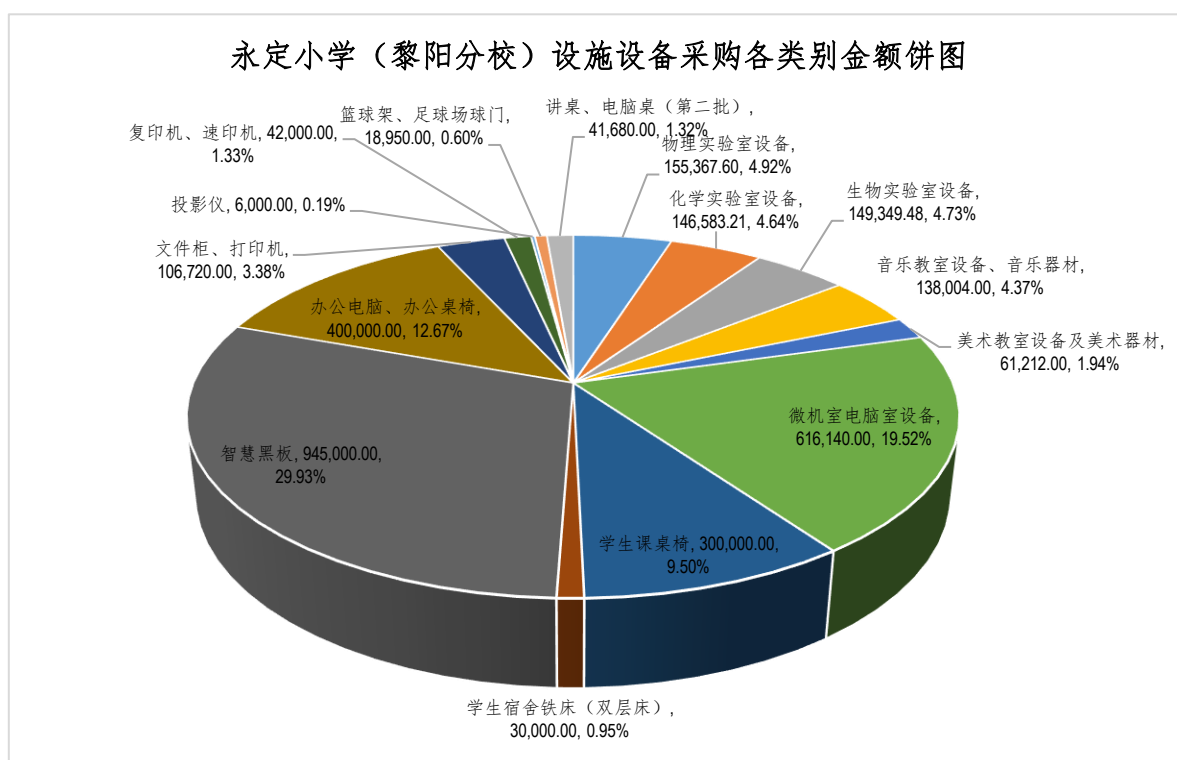

3. 资金投入和使用情况

(1) 收入

2021 年 7 月，根据富财预笈〔2021〕47 号文件，下达富民县教体局永定小学（黎阳分校）实施设备采购专项资金 200.00 万元。

2021 年 9 月 9 日，根据《昆明市财政局 昆明市教体局关于下

达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（昆财教〔2021〕161 号），下达富民县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 468.57 万元。

（2）支出及结余资金上缴

2021 年 10 月，使用富财预笈〔2021〕47 号文件资金支付第二批设备采购款 4.168 万元。

2021 年 12 月，使用昆财教〔2021〕161 号文件中央补助资金支付第一批实施设备采购款 311.53 万元。

2022 年 1 月，使用富财预笈〔2021〕47 号文件资金支付永定小学（黎阳分校）建设其他费用（咨询服务费、消防检测、实体检测、工程检测、跟踪测量等）5 笔共计 39.33 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，富财预笈〔2021〕47 号文件资金结余 156.51 万元（下达资金 200.00 万元、累计支出 43.49 万元），富民县教育局于 2022 年 7 月 13 日将项目结余资金上缴县财政。

永定小学（黎阳分校）设施设备采购项目资金支出明细表

金额单位：万元

年度	凭证号	摘要	支付金额	资金文号
2021 年	2021 年 10 月记账-22#	支付永定小学（黎阳分校）讲桌、电脑桌款	41,680.00	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）
	2021 年 12 月记账-31#	支付永定小学（黎阳分校）设备采购资金	3,115,326.29	《关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（昆财教〔2021〕161 号）
	设备采购款支付小计		3,157,006.29	
2022 年	2022 年 1 月记账-29#	支付黎阳学校建设项目咨询服务费	288,409.00	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）
	2022 年 1 月记账-31#	支付黎阳学校建设项目消防检测服务费	8,743.00	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）
	2022 年 1 月记账-33#	支付全面改薄和能力提升建设项目实体检测费	3,557.00	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）
	2022 年 1 月记账-35#	支付黎阳学校建设项目工程检测费	42,170.00	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）

年度	凭证号	摘要	支付金额	资金文号
	2022 年 1 月记账-36#	支付黎阳学校工程规划批后跟踪测量费	50,375.93	《永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金》（富财预笈〔2021〕47 号）
	学校建设其他费用支付小计		393,254.93	
支出合计			3,550,261.22	
其中：使用富财预笈〔2021〕47 号文件资金			434,934.93	
项目结余资金上缴		富财预笈〔2021〕47 号文件资金结余上缴	1,565,065.07	2022 年 7 月 13 日，富民县教体局将项目结余资金全部上缴县财政

（二）项目绩效目标

根据《财政部 教育部关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（财教〔2021〕152 号），资金绩效目标如下：

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金区域绩效目标表

转移支付名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		中央主管部门	教育部
资金情况 (亿元)		年度金额:			
		其中: 中央补助		见附件 1	
		地方资金			
年度总体目标	年度目标				
	改善农村学校基本办学条件, 增加城镇学位供给, 提升义务教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	66 人以上超大班额		全部消除
			56 人以上大班额		全部消除
		质量指标	两类学校建设情况		办学条件达到所在省份确定的基本办学标准
			新建或改造校舍验收合格率		100%
			购置设施设备的质量合格率		100%
		时效指标	校舍改扩建进度		按年度计划执行
			设施设备采购进度		按年度计划执行
		效益指标	可持续影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度		≥85%

对于本项目，富民县教体局未制定具体绩效目标，我们根据项

目实施的内容及要求，将项目绩效目标进行了细化分解，具体绩效目标如下：

数量指标：采购学校设施设备按合同完成率 100%。

质量指标：设备设施验收合格率 100%。

时效指标：设备设施按合同交付及时率 100%。

成本指标：采购成本控制金额 $\leq$ 313.20 万元。

社会效益指标：容纳学生数及大班额消除情况、设施设备保障学校正常教学情况。

可持续效益指标：设备设施管理相关制度建立情况、设备设施利用率。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 95%。

具体见附件 1-2。

（三）项目组织管理情况

根据本项目特点，其组织管理分为两个层级：县级层面、黎阳学校管理层面。

1. 县级层面

本项目的行业主管部门为富民县教育体育局，负责黎阳学校的建设、投入使用、教学设施设备采购及交付；检查、督导学校开展正常教育教学活动；统筹项目经费的使用；开展项目绩效自评。

为推进黎阳分校正常开展教学，县教育局开展教学设施设备的采购和移交工作，包括：项目立项批复、设备采购招标、项目验收、设备款支付、设备移交等工作。

2. 昆一中富民学校（黎阳分校）管理层面

昆一中富民学校（黎阳分校）负责制定学校教学、资产管理相关工作制度、流程，规范使用教学设施设备，提高设备使用效率，保障交付的教学资产安全、完整。

学校在接收两个批次设施设备后，按教学要求对设备进行了配置，由设备管理科室对课桌椅、黑板、实验室设备、音体美设备、微机室设备、住宿设备等进行日常管理和维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的，是通过对 2021 年永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范、产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，发现问题，提出科学合理的、具有可操作性的建议，从而推动预算部门有效履职，强化预算部门绩效意识及成本意识，规范财政资金管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2021 年永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金 200.00 万元。评价范围为学校两个批次设施设备采购及投入使用情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）公平性原则

公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则，客观真实的反映绩效评价结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）客观性原则

绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取比较法、公众评判法、成本效益分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价部门整体效益。

（3）可行性原则

绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则

绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2. 绩效评价的依据

（1）预算绩效管理相关文件

① 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

② 《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

③ 《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）。

（2）与项目相关依据文件

①《教育事业发展“十四五”规划》;

②《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教财〔2021〕3号);

③《教育部 财政部关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》(财教〔2021〕152号);

④《关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》(昆财教〔2021〕161号);

⑤《富民县发展和改革局关于同意增加富民县永定小学(黎阳分校)建设内容和追加投资规模的批复》(富发改投资审批〔2020〕84号);

⑥《富民县财政局关于下达永定小学(黎阳分校)设施设备采购专项资金的通知》(富财预笈〔2021〕47号)。

3. 绩效评价指标体系(附表说明)

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)文件要求,本项目绩效评价以100分计,设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标,权重分别为:决策15%、过程20%、产出35%、效益30%。

(1)“决策”指标由“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”3个二级指标构成,同时细化为6个三级指标。主要考察项目立项是否有充分的依据,是否符合国家、省、市相关规定,以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求;项目绩效目标设立是否合理、明确,任务分解是否结合项目实际情况科学确定;项目资金投入方面,预算资金分配是否合理、是否及时足额到位。

(2) “过程”指标由“资金管理”、“项目管理”2个二级指标构成，同时细化为6个三级指标。主要考察项目预算资金使用的合规性、财务管理的规范性和项目组织实施的有效性三方面的内容。

(3) “产出”指标由“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4个二级指标构成，同时细化为7个三级指标。主要考察项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的完成情况。

(4) “效益”指标由“社会效益”、“可持续效益”、“满意度”3个二级指标构成，同时细化为6个三级指标。主要反映项目实施产生的社会效益、可持续效益，同时通过实施问卷调查，了解受益群体对项目实施效果的满意程度。

具体见附件2。

4. 绩效评价的方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）文件规定，结合本项目的特点，主要采用方法如下：

(1) 比较法。针对本次绩效评价，我们通过诸如项目数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标完成情况，分别与相应的绩效指标值进行比较，综合分析各项指标的实现程度。

(2) 成本效益分析法。针对本次绩效评价，通过将项目资金投入与项目产出、效益情况进行关联性分析，评价项目投入的经济性、产出效益的合理性。

(3) 公众评判法。通过现场调研、召开座谈会、满意度问卷，

了解项目实施效果情况，以发现项目立项、过程管理、绩效管理存在的问题，着重对预算产出、取得的效果情况进行调查了解，为评价提供相关依据。对绩效评价中难以定量评价但又体现项目绩效管理的重要环节，通过问卷和调研方式获取真实情况，将定性问题转化为定量评分，作为量化评价的依据。引入行业专家、绩效专家，参与方案与报告的审核，提高绩效评价工作质量。

5. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于比较绩效指标完成情况。本项目绩效评价指标体系满分 100 分，对所有的末级评价指标一一评价、打分后，进行得分加总，得出评价得分，根据总得分，将评价结果分为 4 个等级：优（得分 90 分以上，含 90 分）、良（得分 80 分-90 分，含 80 分）、中（得分 60 分-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目前期准备：与委托方对接，对项目基本情况进行初步了解；根据评价任务进行前期准备，组织相关专业技术人员了解项目相关政策背景、实施内容、资金投入等相关情况。

2. 开展前期调研：在富民县财政局组织安排下，与项目实施部门进行对接，建立协调机制，明确项目联络人，到项目实施部门开展前期调研，收集项目批复及资金安排文件、预算执行情况、产出情况等相关资料。

3. 确定抽样数量及问卷访谈样本：结合调研内容和项目实施部门提供的资料，设定抽样数量、问卷访谈的群体及样本量，并完成

评价指标体系设置工作。

4. 开展实地评价：根据评价实施方案，深入项目现场进行实地评价，与实施单位进行充分沟通交流，开展调研访谈、现场踏勘、问卷调查、资料收集等实地评价工作，完成实地评价相应工作底稿。

5. 撰写报告：在实地评价工作结束后，整理汇总相关材料 & 数据，对于数据不清晰、不完整的情况，评价组作进一步取证核实，经分析研判，征求专家意见，形成总体评价结论，撰写评价报告。

6. 报告征求意见及修改完善：将绩效评价报告（征求意见稿）提交被评价单位、富民县财政局征求意见，在充分考虑反馈意见的基础上，修改完善评价报告。

7. 出具评价报告：按规范要求出具绩效评价报告，整理相关工作底稿，配合做好报告结果应用等相关工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

经过对 2021 年永定小学（黎阳分校）设施设备采购专项资金进行绩效评价，分析了项目决策、过程、产出、效益等 4 个方面，该项目综合得分 80.86 分，评价等级为良。

项目绩效评价指标体系一级指标得分统计表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	15 分	20 分	35 分	30 分	100 分
得分率	76.67%	65.75%	96.29%	75.03%	80.86%
得分	11.50	13.15	33.70	22.51	80.86

本项目依据中央、省、市、县关于推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的相关文件，富民县教体局于 2020 年 12 月-2021

年 8 月实施了永定小学（黎阳分校）建设项目，并于 2021 年 9 月顺利开学，为解决学校教学设施设备不足的问题，富民县教体局于 2021 年 8-10 月开展了两次设施设备采购，并对到位的采购物资作了移交，为学生入住、学校正常教学提供了设备保障。但项目也存在第二批采购验收单未签字、设备移交后学校未计入资产账和列入资产卡片管理、部分音乐设备及实验室设备利用率不高、后续管护责任落实不到位等问题。

（二）绩效目标实现情况

绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明
产出指标	数量指标	第一批学校设施设备采购按合同到位率	100%	第一批教学设备设施采购，共计 14 大类，2368 项，合同金额 311.5326 万元，采购设备设施于 2021 年 9 月 30 日至 10 月 13 日陆续到位并验收，2021 年 10 月 13 日富民县教体局、供货方、学校三方共同作了验收，并移交给学生。设施设备到位率 100%。
		第二批学校设施设备采购按合同到位率	100%	第二批设备采购，采购讲桌 4 张、电脑桌 52 张，共计 4.168 万元，2021 年 10 月 25 日作了验收，设备到位率 100%。
	质量指标	第一批学校设施设备采购验收合格率	100%	第一批教学设备设施采购，由富民县教体局、供货方、学校三方共同作了验收，出具了验收报告，其中：采购第六部分 7--15 项（价值 3.67 万元），因学校已完成安装，为避免重复投资，替换为同等价值的 21 个讲台（价值 3.675 万元），替换商品按 3.67 万元结算，即合同总金额不变，替换事项已列入合同条款。
		第二批学校设施设备采购验收合格率	100%	第二批设备到位后，供货方出具了验收单，但验收方（富民县教体局、学校）未在验收单上签署意见及盖章。
	时效指标	第一批设备设施采购按合同交付及时率	按合同时效	合同第七条未对交货期作出约定，采购文件中交货期为 2021 年 8 月 31 日，实际交货期及验收期为 2021 年 9 月 30 日至 10 月 13 日。
		第二批设备设施采购按合同交付及时率	按合同时效，7 个工作日交付	2022 年 10 月 20 日签订合同，10 月 25 日完成交付及验收。
	成本指标	采购成本控制	≤313.2 万元	第一批设备设施采购金额为 311.5326 万元、第二批设备设施采购金额为 4.168 万元，合计采购金额为 315.7006 万元，超出预算金额 2.5006 万元，超预算比例为 0.8%。
效益指标	社会效益指标	容纳学生数及大班额消除情况	容纳学生数与计划匹配、56 人以上大班额	学校建设规模为 1500 人，2021 年开学时，入住昆一中富民学校初中一年级学生 830 余名，按三年三个年级入住进行统计，不足以容纳初中三个年级的学生（按每年 830 名学生计算），

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明
			全部消除	入住学生与学校规模匹配度不强。 其次，根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）精神，要进一步降低义务教育阶段56人以上大班额比例、满足学生寄宿需求、提升教育信息化应用水平、有效保障体育美育劳动教育条件、加强校园文化建设。黎阳学校班级人数均为56人以下，无56人以上大班额。
		设施设备保障学校正常教学情况	正常保障	问卷A6. 您对学校现有的教学仪器设备配置、管理和使用是否满意？经统计47份满意度问卷，满意率为89.79%。 其次，通过问卷，学校师生反映的问题如下：宿舍、食堂下水经常出现堵塞等问题，学生宿舍配备太少；网络不稳定，多媒体有时连不上网络；多媒体黑板等设备有时反应不灵敏，视频，flash动画等有时播放不出来；设备监管存在不足，有学生会破坏多媒体黑板的情况，无专人管理实验室设备；供货方处理质量问题不及时。
	可持续效益	设备设施管理相关制度建立情况	建立制度并执行	设备设施移交昆一中富民学校（黎阳分校）后，相关实施设备纳入教学管理，但相关管理制度、管护维修责任还未落实到位，存在部分设备利用率不高、设备损坏未及时维修等情况，通过项目满意度问卷，学校师生反映的问题如下： ①宿舍、食堂下水经常出现堵塞等问题，学生宿舍配备太少。 ②网络不稳定，多媒体有时连不上网络。 ③多媒体黑板等设备有时反应不灵敏，视频，flash动画等有时无法正常播放。 ④设备监管存在不足，有学生会破坏多媒体黑板的情况，无专人管理实验室设备。 ⑤供货方处理问题不及时，有推诿嫌疑。
		设备设施利用率	80%以上	从学校各类设施设备的利用情况问卷看，微机房利用率较高，其他如物理实验器材、生物实验仪器、音乐器材利用率较低，另有美术教学设备、化学实验仪器（初一年级无化学课程）利用率几乎为0%。
	满意度指标	教体局工作人员对项目满意度	≥90%	共回收教体局工作人员满意度问卷29份，满意度综合得分为97.47分。
	服务对象满意度指标	学生老师对实施设备的满意度	≥90%	共回收学校老师学生满意度问卷47份，满意度综合得分为86.44分。

四、绩效评价指标分析

评价组根据取得的数据，对照绩效评价指标体系及评分标准逐项进行分析、评价并打分，各具体指标评价情况如下（详见附件2）。

（一）项目决策情况分析

项目决策类指标，包括项目立项的合规性、目标设立的合理性、资金投入的匹配性 3 个方面的内容，并细化为 6 个三级指标。指标权重 15.00 分，扣 3.50 分，实际得分 11.50 分，得分率 76.67%。

1. 项目立项

该部分考察立项依据充分性、立项程序规范性。本项指标权重 5.00 分，扣 0 分，评价得分 5.00 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

A1.项目立项指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
A1.项目立项	5.00	100.00%	5.00
A11.立项依据充分性	3.00	100.00%	3.00
A12.立项程序规范性	2.00	100.00%	2.00

（1）立项依据充分性

项目在立项依据方面，符合《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）、《富民县发展和改革局关于同意增加富民县永定小学（黎阳分校）建设内容和追加投资规模的批复》（富发改投资审批〔2020〕84 号）、《昆明市财政局 昆明市教体局关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（昆财教〔2021〕161 号）、《富民县人民政府办公室关于永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金请示的批复》等文件要求

项目立项与部门职责匹配方面，项目由富民县教体局负责设施设备采购，与教体局相应的部门职责匹配。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（2）项目立项程序规范性

2021 年 7 月 20 日，富民县教体局向县人民政府上报了《关于请求安排永定小学（黎阳分校）设施设备采购资金的请示》（富教局〔2021〕50 号），该请示文件经县十六届人民政府 2021 年第 12 次常务会研究，同意项目投入 313.2 万元，并由县级财政安排资金 200 万元（其余部分由富民县教体局自筹解决），2021 年 7 月 23 日由富民县人民政府办公室下达批复。项目立项程序规范。

该项指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

2. 项目目标

该部分主要考察项目目标设立情况，主要考察项目目标设立的合理性、明确性等情况。本项指标权重 5.00 分，扣 3.50 分，实际得分 1.50 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

A2. 绩效目标指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
A2.绩效目标	5.00	30.00%	1.50
A21.绩效目标合理性	2.00	25.00%	0.50
A22.绩效指标明确性	3.00	33.33%	1.00

（1）绩效目标合理性

中央资金（昆财教〔2021〕161 号文件）下达时，对 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金设定了绩效目标，绩效目标设定较为笼统，未针对永定小学（黎阳分校）设定具体绩效目标。

富民县教体局层面，项目以年中追加的方式取得资金，未设立绩效目标。从项目预期产出、体现正常业绩水平来看，项目绩效目

标主要应围绕采购数量质量、采购时效、成本控制、验收合格情况、设备投入使用效益、使用者满意度等方面进行设定。因项目预算资金下达（富财预笈〔2021〕47号文件）时未附项目绩效目标表，扣1.50分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准扣1.50分，得0.5分。

（2）绩效指标明确性

昆财教〔2021〕161号文件对项目资金绩效目标设定较为笼统，未细化、分解为可考核的绩效指标。

富财预笈〔2021〕47号文件未设定项目绩效目标，无法根据资金文件进行绩效目标实现情况考核。

项目应设定采购数量质量、采购时效、成本控制、验收合格情况、设备投入使用效益、使用者是否满意等方面的指标。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准扣分2.00分，得1.00分。

3. 资金投入

该部分主要考察项目资金投入情况，主要考察项目预算编制的科学性、资金分配的合理性及项目资金分配是否符合学校实际情况。本项指标权重5.00分，扣0.00分，实际得分5.00分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

A3. 资金投入指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
A3.资金投入	5.00	100.00%	5.00
A31.预算编制科学性	3.00	100.00%	3.00
A32.资金分配合理性	2.00	100.00%	2.00

（1）预算编制科学性

本项目是为实现永定小学（黎阳分校）正常教学，采购教学类、实验室类、办公类相关资产，采购项目资金预算编制已细化，编制科学。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得分 3.00 分。

（2）资金分配合理性

项目资金全部用于学校开展正常教学所需设备的采购，所需资金由中央资金和县级资金构成，资金分配合理。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得分 3.00 分。

（二）项目过程情况分析

项目过程类指标，包括项目管理、资金管理两方面的内容，共细化分解为 6 个三级指标。指标权重 20.00 分，扣 6.85 分，实际得分 13.15 分，得分率 65.75%。

1. 项目管理

该部分主要考察项目管理制度及流程健全性、项目执行有效性、项目档案管理规范性。本项指标权重 10.00 分，扣 3.50 分，实际得分 6.50 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

B1. 项目管理指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
B1.项目管理	10.00	65.00%	6.50
B11. 项目管理制度及流程健全性	3.00	50.00%	1.50
B12. 项目执行有效性	4.00	50.00%	2.00
B13. 项目档案管理规范性	3.00	100.00%	3.00

（1）项目管理制度及流程健全性

县教体局层面，已制定了预算管理、收支管理、资产管理、采

购管理、合同管理、建设项目管理等内控制度，相关制度和流程较为健全。项目具体工作由基建科执行，基建科建立了相关工程立项、招投标、实施过程管理、验收管理、竣工结（决）算管理等相关制度和流程。

学校建成后由昆一中富民学校初中部一个年级入住，入住后，新学校的资产管理、教学管理、后勤管理、实验室管理等相关制度和流程还不够健全。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准扣 1.50 分，得分 1.50 分。

（2）项目执行有效性

县教体局层面，项目立项批复、招投标、采购实施、验收、设备移交等工作执行较好，但存在第二批采购资产未在验收单签字、未办理移交手续等情况。

昆一中富民学校（黎阳学校）层面，项目接收及投入使用管理方面，还存在部分设备利用率不够高、设备维修不及时、接收资产未及时计入学校固定资产账等情况。

该项指标满分为 4.00 分，根据评分标准扣 2.00 分，得分 2.00 分。

（3）项目档案管理规范性

本项目档案管理工作由富民县教体局基建科负责，项目档案由专人管理，项目档案资料已分类整理，保管规范。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得分 3.00 分。

2. 资金管理

该部分主要考察项目资金到位率、预算执行完成率、资金使用合规性。本项指标权重 10.00 分，扣 3.35 分，实际得分 6.65 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

B2.资金管理指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
B2.资金管理	10.00	66.50%	6.65
B21. 项目资金到位率	3.00	100.00%	3.00
B22. 预算执行完成率	3.00	21.75%	0.65
B23. 资金使用合规性	4.00	75.00%	3.00

（1）项目资金到位率

2021 年 7 月，根据富财预笺〔2021〕47 号文件，下达富民县教体局永定小学（黎阳分校）实施设备采购专项资金 200.00 万元。

2021 年 9 月 9 日，根据《昆明市财政局 昆明市教体局关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》（昆财教〔2021〕161 号），下达富民县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 468.57 万元。

项目所需资金均及时到位。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（2）预算执行完成率

富财预笺〔2021〕47 号文件下达项目资金 200.00 万元，2021 年支出 4.168 万元、2022 年支出 39.33 万元，支出金额共计 43.49 万元，预算资金执行率 21.75%，结余资金 156.51 万元已于 2022 年 7 月上缴县财政。项目资金执行率较低，主要是使用昆财教〔2021〕161 号中央补助资金支付了第一批采购款 311.53 万元。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准，得分=预算执行率

×3分=21.75%×3分=0.65分，扣分2.35分，得0.65分。

(3) 资金使用合规性

根据评分细则，资金使用应符合项目预算批复或资金规定用途，2022年1月，使用富财预笺〔2021〕47号文件资金支付永定小学（黎阳分校）建设其他费用（咨询服务费、消防检测、实体检测、工程检测、跟踪测量等）5笔共计39.33万元，未用于采购实施设备。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准扣1.00分，得3.00分。

(三) 项目产出情况分析

项目产出类指标，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4类指标，再细化分解为7个三级指标。指标权重35.00分，扣1.30分，实际得分33.70分，得分率96.29%。

1. 产出数量

该部分主要考察第一批学校设施设备采购按合同到位率、第二批学校设施设备采购按合同到位率等指标实现情况。本项指标权重12.00分，扣0.00分，实际得分12.00分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

C1.产出数量指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
C1.产出数量	12.00	100.00%	12.00
C11. 第一批学校设施设备采购按合同到位率	10.00	100.00%	10.00
C12. 第二批学校设施设备采购按合同到位率	2.00	100.00%	2.00

(1) 第一批学校设施设备采购按合同到位率

第一批教学设备设施采购，共计 14 大类，2368 项，合同金额 311.5326 万元，采购设备设施于 2021 年 9 月 30 日至 10 月 13 日陆续到位并验收，2021 年 10 月 13 日富民县教体局、供货方、学校三方共同作了验收，并移交给学校。设施设备到位率 100%。

该项指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。

(2) 第二批学校设施设备采购按合同到位率

第二批设备采购，采购讲桌 4 张、电脑桌 52 张，共计 4.168 万元，2021 年 10 月 20 日作了验收，设备到位率 100%。

该项指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

2. 产出质量

该部分主要考察项目各项工程一次验收合格情况、安全事故发生情况。本项指标权重 12.00 分，扣 0.50 分，实际得分 11.50 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

C2.产出质量指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
C2.产出质量	12.00	95.83%	11.50
C21. 第一批学校设施设备采购验收合格率	10.00	100.00%	10.00
C22. 第二批学校设施设备采购验收合格率	2.00	75.00%	1.50

(1) 第一批学校设施设备采购验收合格率

第一批教学设备设施采购，由富民县教体局、供货方、学校三方共同作了验收，出具了验收报告，其中：采购第六部分 7--15 项（价值 3.67 万元），因学校已完成安装，为避免重复投资，替换为同等价值的 21 个讲台（价值 3.675 万元），替换商品按 3.67 万元结算，即合同总金额不变，替换事项已列入合同条款。验收合格率

为 100%。

该项指标满分为 10.00 分，根据评分标准得分 10.00 分。

(2) 第二批学校设施设备采购验收合格率

第二批设备到位后，供货方出具了验收单，但验收方（富民县教体局、学校）未在验收单上签署意见及盖章。因验收方面存在瑕疵，扣 0.50 分。

该项指标满分为 2.00 分，根据评分标准扣 0.50 分，得分 1.50 分。

3. 产出时效

该部分主要考察设备设施采购按合同交付时效情况。本项指标权重 6.00 分，扣 0 分，实际得分 6.00 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

C3.产出时效指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
C3.产出时效	6.00	100.00%	6.00
C31. 第一批设备设施采购按合同交付及时率	3.00	100.00%	3.00
C32. 第一批设备设施采购按合同交付及时率	3.00	100.00%	3.00

(1) 第一批设备设施采购按合同交付及时率

第一批设备设施采购，合同第七条未对交货期作出约定，合同签订于 2021 年 8 月 26 日，实际交货期及验收期为 2021 年 9 月 30 日至 10 月 13 日。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得分 3.00 分。

(2) 第二批设备设施采购按合同交付及时率

第二批设备设施采购，2022 年 10 月 20 日签订合同，10 月 20

日完成交付。

该项指标满分为 3.00 分，根据评分标准得分 3.00 分。

4. 产出成本

该部分主要考察项目成本控制的情况，本项指标权重 5.00 分，扣 0.80 分，得分 4.20 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

C4.产出时效指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
C4.产出成本	5.00	84.00%	4.20
C41.项目成本控制情况	5.00	84.00%	4.20

(1) 项目成本控制情况

第一批设备设施采购金额为 311.5326 万元、第二批设备设施采购金额为 4.168 万元，合计采购金额为 315.7006 万元，超出 313.2 万元的预算金额 2.5006 万元，超预算比例为 0.8%。

该项指标满分为 5.00 分，根据评分标准扣 0.80 分，得分 4.20 分。

(四) 项目效益情况分析

项目效益类指标，包括项目社会效益、可持续效益及满意度 3 类指标，再细化分解为 6 个三级指标。指标权重 30.00 分，扣 7.49 分，实际得分 22.51 分，得分率 75.03%。

1. 社会效益

该部分考察容纳学生数及大班额消除情况、设施设备保障学校正常教学情况。本项指标权重 12.00 分，扣 3.06 分，得分 8.94 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

D1.项目社会效益指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
D1.社会效益	12.00	74.5%	8.94
D11. 容纳学生数及大班额消除情况	6.00	75.00%	4.50
D12. 保障学校正常教学并容纳学生	6.00	74.00%	4.44

（1）容纳学生数及大班额消除情况

首先，学校建设规模为 1500 人，2021 年开学时，入住昆一中富民学校初中一年级学生 830 余名，按三年三个年级入住进行统计，不足以容纳初中三个年级的学生（按每年 830 名学生计算），入住学生与学校规模匹配度不强。

其次，根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）精神，要进一步降低义务教育阶段 56 人以上大班额比例、满足学生寄宿需求、提升教育信息化应用水平、有效保障体育美育劳动教育条件、加强校园文化建设。黎阳学校班级人数均为 56 人以下，无 56 人以上大班额。

该项指标满分为 6.00 分，根据评分标准扣 1.50 分，得 4.50 分。

（2）设施设备保障学校正常教学情况

问卷 A6. 您对学校现有的教学仪器设备配置、管理和使用是否满意？经统计 47 份满意度问卷，满意率为 89.79%，扣分=（95-89.79）×0.3=1.56 分。

其次，通过问卷，学校师生反映的问题如下：宿舍、食堂下水经常出现堵塞等问题，学生宿舍配备太少；网络不稳定，多媒体有时连不上网络；多媒体黑板等设备有时反应不灵敏，视频，flash

动画等有时播放不出来；设备监管存在不足，有学生会破坏多媒体黑板的情况，无专人管理实验室设备；供货方处理质量问题不及时。

该项指标满分为 6.00 分，根据评分标准扣 1.56 分，得 4.44 分。

2. 项目可持续效益

该部分考察设备设施管理相关制度建立情况、设备设施利用率情况。本项指标权重 8.00 分，扣 4.00 分，得分 4.00 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

D2.项目可持续效益指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
D2.项目可持续效益	8.00	50.00%	4.00
D21. 设备设施管理相关制度建立情况	4.00	50.00%	2.00
D22. 设备设施利用率	4.00	50.00%	2.00

（1）设备设施管理相关制度建立情况

设备设施移交昆一中富民学校（黎阳分校）后，相关实施设备纳入教学管理，但相关管理制度、管护维修责任还未落实到位，存在部分设备利用率不高、设备损坏未及时维修等情况，通过项目满意度问卷，学校师生反映的问题如下：

①宿舍、食堂下水经常出现堵塞等问题，学生宿舍配备太少。

②网络不稳定，多媒体有时连不上网络。

③多媒体黑板等设备有时反应不灵敏，视频，flash 动画等有时无法正常播放。

④设备监管存在不足，有学生会破坏多媒体黑板的情况，无专人管理实验室设备。

⑤供货方处理问题不及时，有推诿嫌疑。

该项指标满分为 4.00，根据评分标准扣 2.00，得 2.00。

(2) 设备设施利用率

从学校各类设施设备的利用情况问卷看，微机室利用率较高，其他如物理实验器材、生物实验仪器、音乐器材利用率较低，另有美术教学设备、化学实验仪器（初一年级无化学课程）利用率几乎为 0%。

各类设备设施利用情况问卷调查统计

选项	人数小计	百分比	备注
物理实验器材	9	19.15%	
生物实验仪器	4	8.51%	
化学实验仪器	0	0.00%	初三年级才有化学课
音乐器材	3	6.38%	
美术教学设备	0	0.00%	
微机教学设备	31	65.96%	
本题有效填写人次	47		

该项指标满分为 4.00，根据评分标准扣 2.00，得 2.00。

3. 项目满意度

该部分考察项目满意度情况。本项指标权重 10.00 分，扣 0.43 分，得分 9.57 分。各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

D3.项目满意度指标分析

指标名称	指标权重	业绩值	实际得分
D3.项目满意度	10.00	95.70%	9.57
D31. 行政主管部门工作人员满意度	4.00	97.47%	4.00
D32. 学校受益师生满意度	6.00	86.44%	5.57

本项目绩效评价问卷调查，主要面向两类群体：（1）行政主管部门工作人员；（2）学校受益师生。共计回收有效问卷 76 份，其

中：

回收富民县教体局工作人员满意度问卷 29 份，满意度综合得分为 97.47 分。

回收学校老师学生满意度问卷 47 份，满意度综合得分为 86.44 分。扣分=（90-86.44）×6×2%=0.43 分。

问卷人数及问卷调查得分统计表

人员类型	问卷数量小计	问卷得分	权重	综合得分
富民县教体局工作人员	29	97.47	40%	38.99
学校受益师生	47	86.44	60%	51.86
合计	76		100%	90.85

五、存在的问题及原因分析

（一）前期预算阶段调研不深入，导致部分音乐、美术设备利用率不够高

从设备移交学校后的利用率来看，课桌、黑板、办公设备等利用率较高，音乐、美术设备器材利用率低，部分音乐教学设备如钢琴、电贝司尚未使用，且无相应的音乐教师，造成设备闲置；其次，因入住学生为初中一年级，还未开设化学课，化学实验室几乎处于闲置状态。

（二）资产移交昆一中富民学校后，未落实好责任管理

经现场查看设备利用情况，设备保管责任落实不到位，个别实验台设备损坏、多媒体黑板利用率低，部分设备损坏不能及时修理，截至报告日，富民县教育体育局已于 2022 年 11 月 18 日下发《关于对 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金采购学校教学设施设备项目物资进行登记上账的通知》（富教通〔2022〕

106 号), 要求永定小学(黎阳分校)设施设备及时入账, 学校设施设备正在入账统计及清查中。

六、建议

(一) 美术、音乐课程设备、实验室设备的配备建议

为优化学校设施设备配置, 使学校设施、设备采购更加符合学校实际, 建议考虑如下因素: 音乐课、美术课的开设, 应体现地方特色和民族特色, 如民族音乐、民族乐器、民族舞蹈绘画、民族工艺品制作等, 以乡土艺术、热爱家乡、传承非物质文化遗产为主题, 既节约了资金投入, 又能体现民族团结进步特色。

其次, 教学类、实验室类设施采购, 按开课的计划进度进行, 如化学课为初中三年级课程, 根据学生升入初三的时间采购该类设备, 以避免设备长期闲置。

(二) 资产移交后管理的相关建议

目前, 学校已逐步进入了正常教学阶段, 建筑、设施、设备已完成移交, 为做好移交后的管理, 让设施设备持续发挥作用, 相关建议如下:

1. 资产正式移交后, 应执行质保期(一般为 1 年)的规定, 在质保期内发生质量问题, 由设备供应方履行维护维修责任。

2. 学校制定教学类、办公类、住宿类、实验室类、音体美各类设施、器材的管理办法, 确定管护责任主体, 设备发生损坏的, 及时进行维修, 将设施设备管理好、运营好。

3. 行政主管部门定期对移交的设施设备使用情况、管理情况进行监督与考核, 让设备持续发挥效益。

4. 根据国家、省、市关于义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的相关要求，科学配备学校教学设施，开展学生教师满意度和需求调研，定期进行维护、维修、更新换代，保障教学的正常开展。

七、其他需要说明的问题

无

附件

附件 1-1 原项目绩效目标申报表

附件 1-2 修订后项目绩效目标表

附件 1-3 项目绩效目标完成情况表

附件 2 绩效评价指标体系

附件 3 问卷调查统计表
